



A. Materiál:

Bod rokovania	Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok“
Dátum rokovania MsZ	27.9.2023
Predložené poslancom MsZ	20.9.2023
Predkladateľ	Ing. Ján Pavlík, PhD. vedúci oddelenia projektov a grantov
Spravodajca	Ing. Ján Pavlík, PhD. vedúci oddelenia projektov a grantov
Na základe	
Prizvaný	
Stanovisko komisií	
Stanovisko MsR zo dňa 13.09.2023	MsR odporúča MsZ schváliť uznesenie Hlasovanie: 5-0-0
Zoznam príloh	Príloha č. 1 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Príloha č. 2 Mandátna zmluva na externý manažment projektu

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. schvaľuje

- a) súhlas s odstúpením od zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok“.

C. Dôvodová správa

Mesto Ružomberok má pre tento projekt má zazmluvnený externý manažment, STUDNICA, n.o. (mandátna zmluva tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu), ktorá na základe splnomocnenia, konala v mene mesta Ružomberok vo veci vykonania verejného obstarávania na výber dodávateľa pre projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok“.

Výsledok VO bol mestu doručený dňa 24.8.2023:

Najnižšia cena pre 1. časť zákazky: 42 852,00 € s DPH



Najnižšia cena pre 2. časť zákazky: 97 432,80 € s DPH

Hodnota zákazky pre projekt spolu: 140 284,80 € s DPH

Zmluvy s víťaznými uchádzačmi zatiaľ neboli podpísané vzhľadom na rizikové faktory financovania z NFP a posuny v časovom harmonograme.


Účinnosť zmlúv s dodávateľmi by nastala až po schválení kontroly VO na Ministerstve dopravy SR (stanovená lehota na vykonanie kontroly je 20 pracovných dní, reálne trvá dlhšie).

Projekt na nachádza vo výraznom časovom posune. Pôvodný harmonogram je znázornený na grafe Plán realizácie projektu.

Plán realizácie projektu

Projekt: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok (311071CIG7)

■ Aktivita projektu s plánovanými dátumami

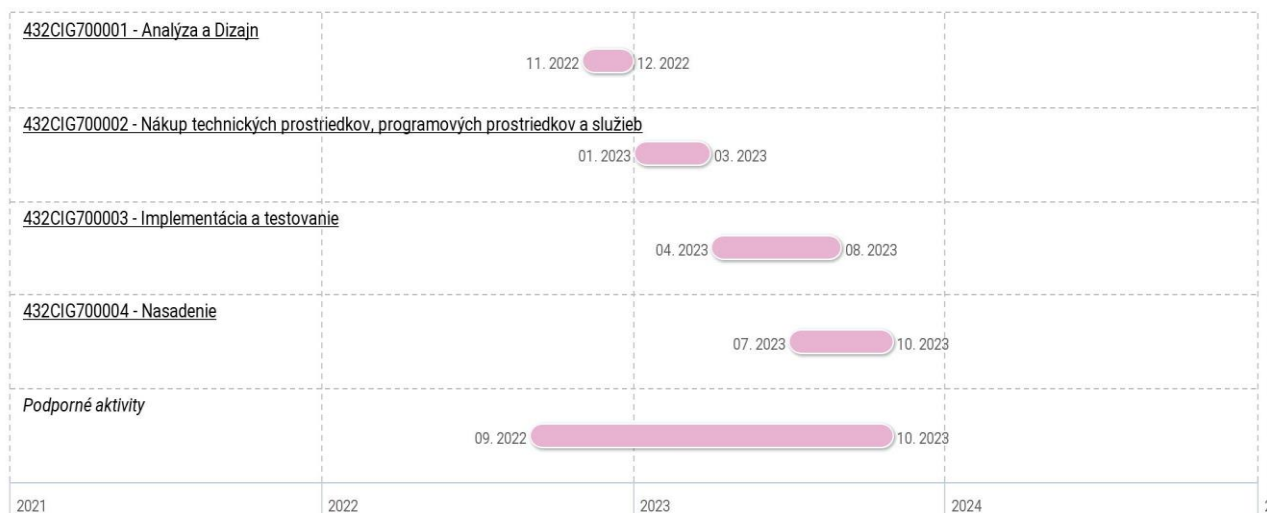

Aktivity boli naplánované na 12 mesiacov (11/2022-10/2023). V prípade realizácie projektu, by sa doba realizácie skrátila na jeden mesiac (10/2023), čo je zmena projektu, ktorá nebola ešte na MIRRI predložená.

Pokračovanie v projekte, za predpokladu, že Ministerstvo dopravy schváli VO a MIRRI schváli zmenu v harmonograme, znamená úhradu faktúr z vlastných zdrojov (do 31.12.2023) a následne čakanie na refundáciu v 1. polroku 2024.

Problém je, že mesto aktuálne nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami.

Návrhy riešenia:

1. Odstúpenie o zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Hľadanie možností na podanie novej ŽoNFP na aktivity projektu Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok v novom programovom období.



D. Dopad na rozpočet:

Predchádzanie vzniku neuznaných výdavkov v sume 140 284,80 €.
